RAMMETIDSPLAN AF 10.11.2020
BOTILBUDET AAGE HOLMS VEJ

ARKITEKTFIRMAET BUNDGAARD MAA ApS

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
1		DISPOSITIONSFORSLAG/ PROJEKTFORSLAG	56 days?	Mon 03-08-20	Mon 19-10-20
2		MYNDIGHEDSPROJEKT	24 days	Tue 20-10-20	Fri 20-11-20
3		UDBUDSPROJEKT	20 days?	Mon 23-11-20	Fri 18-12-20
4		HÅNDVÆRKERUDBUD HOVEDENTREPRISEN	30 days	Mon 21-12-20	Fri 29-01-21
5		LICITATION	1 day?	Fri 29-01-21	Fri 29-01-21
6		INDSTILLING OG ACCEPT AF TILBUDET, BYGHERRE	15 days	Mon 01-02-21	Fri 19-02-21
7		BYGGEPERIODE	160 days?	Mon 22-02-21	Fri 01-10-21
8		AFLEVERING HOVEDENTREPRISEN	1 day?	Fri 01-10-21	Fri 01-10-21
9		IBRUGTAGNINGSTILLADELSE, IDRIFTSÆTTELSE, BRUGERINSTRUKTION	20 days	Mon 04-10-21	Fri 29-10-21

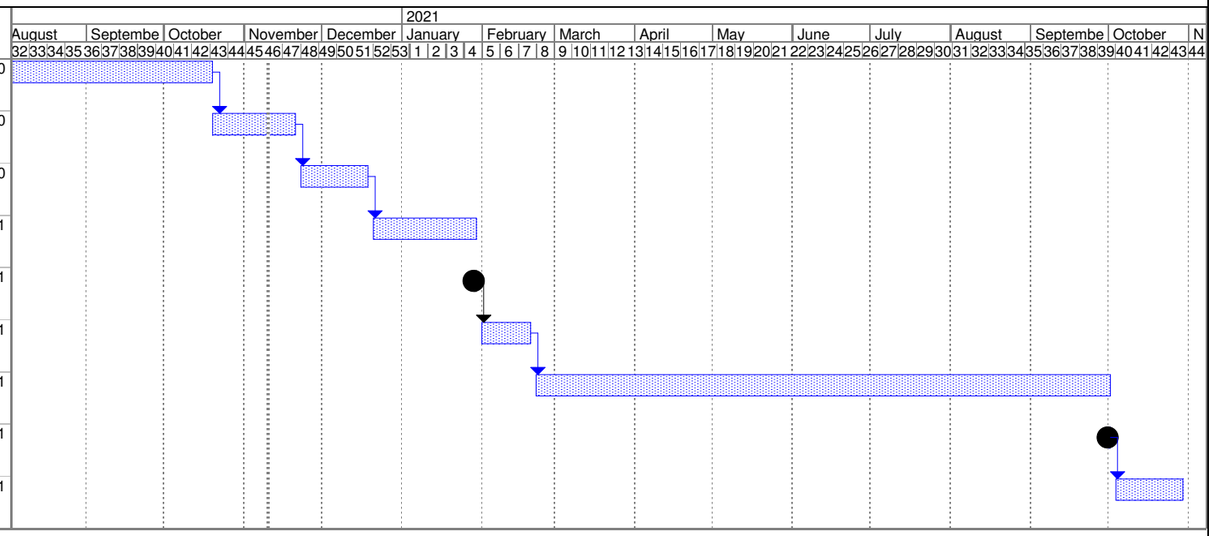

Project: Udbudstidsplan
Date: Tue 10-11-20

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
